REPRESAS GDOR. CEPERNIC Y PTE KIRCHNER

CRONOGRAMA de la Línea de Extra Alta Tensión y auxiliares

Id	Nombre de tarea	Duración
1	**LEAT REPRESAS PATAGÓNICAS**	**1264 días**
2	**Tareas iniciales**	**365 días**
22	**INGENIERÍA LEAT**	**610 días**
74	**SUMINISTROS**	**360 días**
87	**LEAT 500kV ET RSC - EM LB - EM CC (170km)**	**766 días**
88	**FRENTE 1 - LEAT 500kV ET RSC - C6 (51.4 km - 125pks)**	**547 días**
89	**OBRA CIVIL**	**402 días**
90	Movilizacion equipos, campamentos, Obradores	90 días
91	Caminos de servicio y de acceso a la traza	60 días
92	**Fundaciones de Estructuras**	**312 días**
93	Fundaciones Estructuras CR AIA	90 días
94	Fundaciones Estructuras CR Premoldeados	90 días
95	Fundaciones Estructuras Autosoportadas	220 días
96	**MONTAJE ELECTROMECANICO**	**297 días**
97	**Montaje de Estructuras**	**242 días**
98	Montaje de Estructuras CR	60 días
99	Montaje de Estructuras Autosoportadas	150 días
100	Montaje de Puesta a Tierra y Proteccion Galvanica	90 días
101	Tendido de Cables	90 días
102	ENSAYOS, PRUEBAS Y REVISION FINAL	30 días
103	Fin LEAT Frente 1	0 días
104	**FRENTE 2 - LEAT 500kV - C6 - LB (50.6 km - 123pks)**	**484 días**
105	**OBRA CIVIL**	**180 días**
106	Movilizacion equipos, campamentos, Obradores	60 días
107	Caminos de servicio y de acceso a la traza	60 días
108	**Fundaciones de Estructuras**	**90 días**
109	Fundaciones Estructuras CR AIA	90 días
110	Fundaciones Estructuras CR Premoldeados	90 días
111	Fundaciones Estructuras Autosoportadas	60 días
112	**MONTAJE ELECTROMECANICO**	**289 días**
113	**Montaje de Estructuras**	**199 días**
114	Montaje de Estructuras CR	90 días
115	Montaje de Estructuras Autosoportadas	45 días
116	Montaje de Puesta a Tierra y Proteccion Galvanica	90 días
117	Tendido de Cables	90 días
118	ENSAYOS, PRUEBAS Y REVISION FINAL	30 días
119	Fin LEAT Frente 2	0 días
120	**FRENTE 3 - LEAT 500kV EM LB - EM CC (70 km - 170pks)**	**624 días**
121	**OBRA CIVIL**	**392 días**
122	Movilizacion equipos, campamentos, Obradores	90 días
123	Caminos de servicio y de acceso a la traza	90 días
124	**Fundaciones de Estructuras**	**332 días**
125	Fundaciones Estructuras CR AIA	120 días
126	Fundaciones Estructuras CR Premoldeados	120 días
127	Fundaciones Estructuras Autosoportadas	240 días
128	**MONTAJE ELECTROMECANICO**	**347 días**
129	**Montaje de Estructuras**	**160 días**
130	Montaje de Estructuras CR	70 días
131	Montaje de Estructuras Autosoportadas	150 días
132	Montaje de Puesta a Tierra y Proteccion Galvanica	65 días
133	Tendido de Cables	120 días
134	ENSAYOS, PRUEBAS Y REVISION FINAL	45 días
135	Fin LEAT Frente 3	0 días
136	Fin del Proyecto	0 días

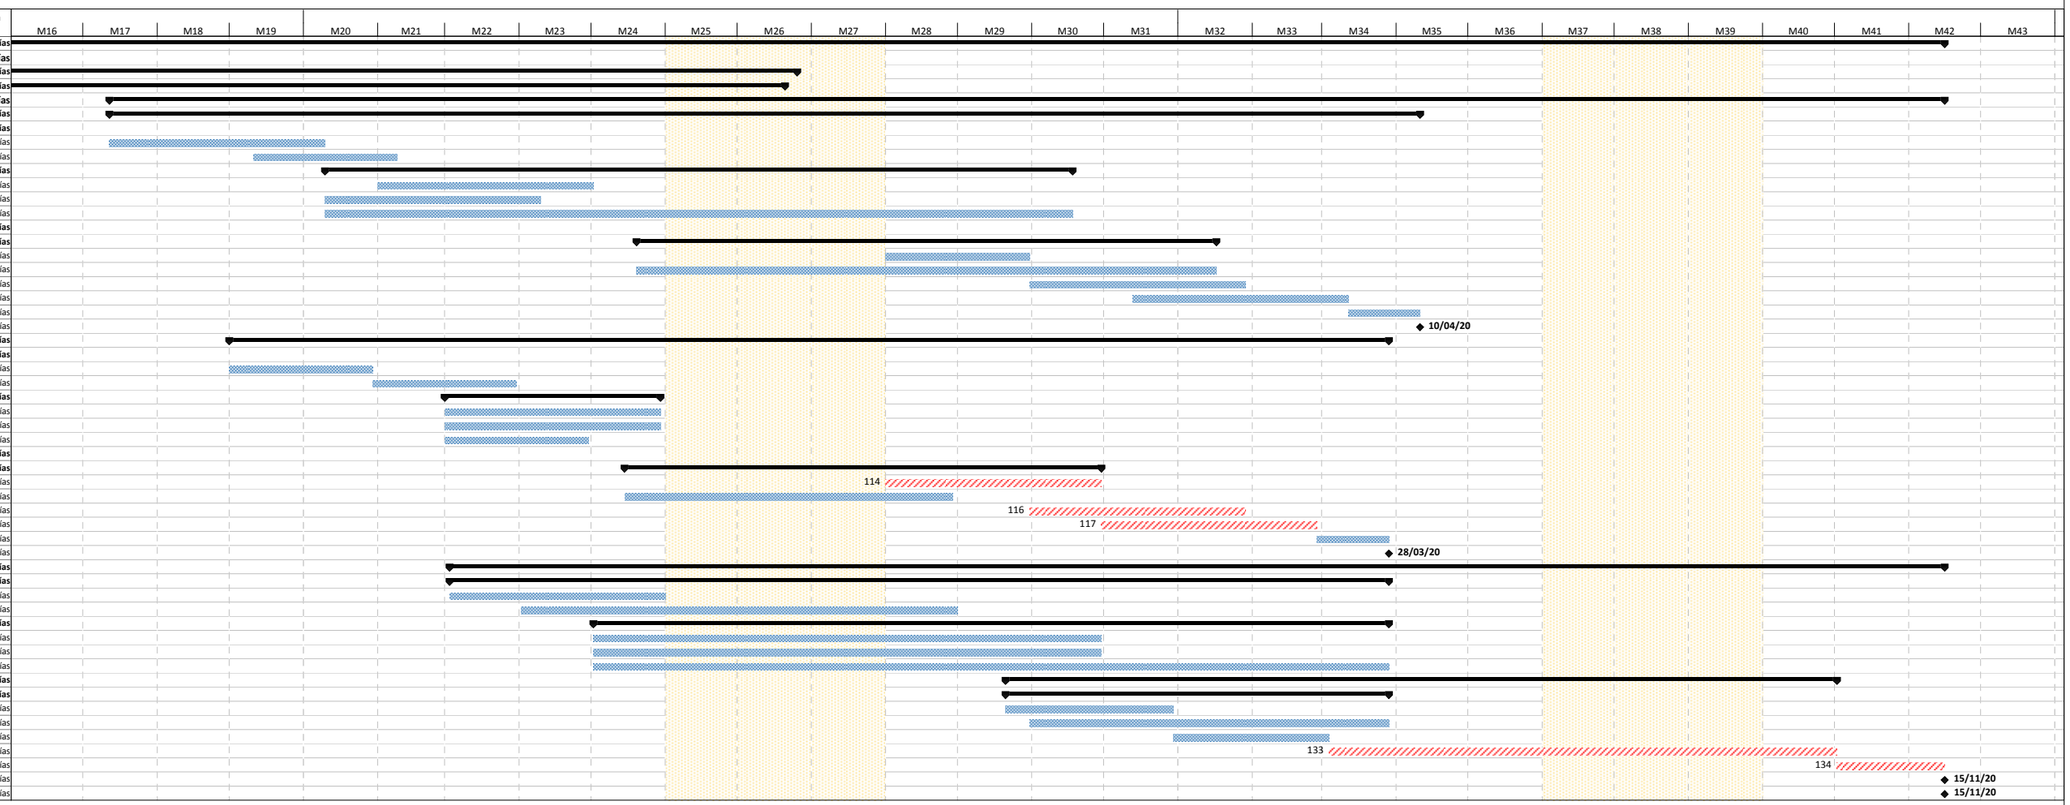

Tarea | Tarea crítica | Hito | Hitos Clave | Resumen
